PROJECT EXECUTION PLAYBOOK

PHM GROUP
UI/UX WEBSITE REDESIGN

Peta kerja end-to-end untuk 4 mahasiswa: dari audit kebutuhan pengguna hingga prototipe HTML, pengujian, dan review Pak Yusuf.

04
anggota tim

04
tahap Double Diamond

01
prototipe HTML

01
paket before-after

ARAHAN STAKEHOLDER

Prioritas UI/UX yang ramah pengguna Gen X; uji akurasi data dibahas setelah rancangan UI/UX disepakati. Hanya gunakan website yang telah diizinkan.

01 Project charter & batasan

Kesepakatan kerja berdasarkan arahan Pak Yusuf terakhir dan pembatasan akses yang sudah disampaikan.

TUJUAN UTAMA

Meningkatkan keterpahaman dan kemudahan penggunaan antarmuka website PHM yang diizinkan, terutama untuk kebutuhan pengguna Generasi X, tanpa mengubah sistem produksi.

DEFINISI SELESAI (USULAN)

- Minimal 1-2 halaman prioritas dirancang ulang.
- Prototipe HTML dapat dibuka dan didemokan.
- Before-after + alasan perbaikan tersedia.
- Hasil uji kegunaan & daftar revisi terdokumentasi.

DALAM CAKUPAN

- Audit UI/UX website yang aksesnya diberikan.
- Kebutuhan pengguna, user flow, wireframe, redesign.
- HTML/CSS/JS statis dengan data simulasi.
- Uji task-based, evaluasi dan iterasi.

DI LUAR CAKUPAN TAHAP AWAL

- INDIGO, ERP internal, database, server, integrasi.
- Akses atau ekspor data operasional rahasia.
- Klaim validasi akurasi data aktual produksi.
- Penerapan ke sistem live tanpa persetujuan.

PRINSIP KEAMANAN: akun & tautan sesuai izin; tidak membagikan akses; tidak menyimpan data sensitif di repositori atau prototipe; dokumentasi layar hanya jika diizinkan.

02 Peta besar pengerjaan

Alur kerja memakai Double Diamond. Setiap fase mempunyai bukti, pemilik, dan gerbang keputusan sebelum lanjut.

01 DISCOVER

Audit website, tugas pengguna, isu navigasi, form, keterbacaan.

BUKTI: Audit log + peta alur

02 DEFINE

Prioritaskan masalah, tetapkan 1-2 halaman dan kriteria sukses.

BUKTI: Design brief + scope

03 DEVELOP

Wireframe, desain high-fidelity, prototipe HTML, uji & iterasi.

BUKTI: Prototipe + test log

04 DELIVER

Paket before-after, demo HTML, temuan uji, review Pak Yusuf.

BUKTI: Review package + revisi

LAPISAN KENDALI: HUMAN-CENTERED DESIGN (HCD)

Pahami konteks pengguna -> rumuskan kebutuhan -> buat solusi -> evaluasi dengan tugas nyata atau simulasi -> revisi. Usia bukan asumsi kemampuan; keputusan desain harus berbasis bukti masalah dan pengujian.

GATE 1	Isu ditemukan	**GATE 2**	Prioritas disetujui tim	**GATE 3**	HTML lulus QA	**GATE 4**	Siap review stakeholder

03 Framework yang digunakan

Bukan sekadar mengganti warna: proses mempunyai landasan, instrumen evaluasi, dan jejak keputusan.

KERANGKA PROYEK

Double Diamond

Discover - Define - Develop - Deliver. Menjaga tim tidak langsung melompat ke coding.

RUJUKAN: Design Council

PRINSIP BERPIKIR

Human-Centered Design

Pahami pengguna, pekerjaan, dan konteks. Solusi dibentuk serta diuji secara iteratif.

RUJUKAN: ISO 9241-210:2019

ALAT AUDIT

Heuristic Evaluation

Periksa konsistensi, visibilitas status, pencegahan error, kontrol, dan keterbacaan.

RUJUKAN: Nielsen / NNGroup

PATOKAN AKSESIBILITAS

WCAG 2.2 AA (target desain)

Kontras teks umum >= 4.5:1; uji pembesaran 200%; target interaksi minimal 24x24 px atau memenuhi pengecualian.

RUJUKAN: W3C

EVALUASI PROTOTIPE

Task-based Usability Test

Ukur keberhasilan tugas, waktu, kesalahan, hambatan, dan kesan pengguna.

RUJUKAN: NNGroup / HCD

Catatan: HCD digunakan sebagai prinsip dan siklus kerja; jangan mengklaim "memenuhi ISO/WCAG" tanpa audit kepatuhan menyeluruh. Pengujian 5 peserta cocok untuk eksplorasi kualitatif, bukan generalisasi statistik.

04

Pembagian tugas: 4 anggota

Satu pemilik utama per stream, namun audit, ideasi, dan pengujian merupakan pekerjaan kolaboratif.

01

PROJECT LEAD / QA

Lu (koordinator)

Scope, agenda, prioritas, review kualitas, komunikasi stakeholder, laporan.

OUTPUT: Charter, progress board, test summary, final pack

02

UX RESEARCHER

Teman A

Audit website, peta tugas, masalah usability, kebutuhan pengguna, skrip uji.

OUTPUT: Audit log, task flow, user needs, test notes

03

UI/UX DESIGNER

Teman B

Wireframe, design system, Figma, spesifikasi layar, before-after.

OUTPUT: Wireframe, mockup, design tokens

04

FRONTEND DEVELOPER

Teman C

HTML/CSS/JS, interaksi mock, responsive, bug-fix, paket demo.

OUTPUT: Prototipe HTML, README, changelog

RACI SEDERHANA

Aktivitas	Lead	UX	Design	Dev
Audit awal	C	A/R	C	C
Scope dan prioritas	A/R	R	C	C
Wireframe dan visual	C	C	A/R	C
HTML prototipe	C	C	C	A/R
Pengujian & ringkasan	A/R	R	C	R
Review Pak Yusuf	A/R	C	C	C

A = accountable
R = responsible
C = consulted

05 Apa yang dikerjakan pertama kali?

Fokus 48 jam awal: merumuskan masalah yang benar, bukan langsung mempercantik website.

01	**KICKOFF 30-45 MENIT** Sepakati tujuan, batasan, tanggung jawab, halaman kandidat, kanal komunikasi.	OUTPUT	Dokumen keputusan tim
02	**AUDIT MANDIRI WEBSITE** Keempat anggota menilai 1-2 alur utama secara terpisah dengan checklist yang sama.	OUTPUT	Temuan dengan bukti + tingkat dampak
03	**PETAKAN USER FLOW** Catat jalur yang dilalui: masuk -> temukan informasi -> baca detail / isi form -> konfirmasi.	OUTPUT	User flow saat ini
04	**TENTUKAN PRIORITAS** Pilih isu berdasarkan dampak pada tugas & frekuensi, lalu lihat usaha perbaikannya.	OUTPUT	Top 5 masalah + 1-2 halaman
05	**SUSUN DESIGN BRIEF** Rumuskan masalah, kelompok pengguna, target tugas dan ukuran keberhasilan awal.	OUTPUT	Brief 1 halaman disepakati

Penting: foto/screenshot yang memuat informasi perusahaan hanya masuk dokumentasi internal jika diizinkan.

06 Audit dan prioritas yang terukur

Temuan harus dapat ditunjukkan dengan alur tugas, bukan opini seperti "kurang bagus".

Kriteria audit	Apa yang diperiksa
Keterbacaan	Ukuran, kontras, jarak antarkomponen, kepadatan tabel.
Navigasi dan istilah	Menu mudah ditemukan; label sesuai bahasa kerja.
Status dan feedback	Pengguna tahu sedang di halaman mana dan apakah tindakan berhasil.
Toleransi kesalahan	Ada pencegahan, pesan error jelas, dan mekanisme koreksi.
Konsistensi	Gaya tombol, tabel, form, dan terminologi tidak berubah-ubah.
Efisiensi tugas	Jumlah langkah untuk 1 tujuan penting tidak berlebihan.

FORMAT TEMUAN (SALIN UNTUK SETIAP ISU)

ID | Halaman / tugas | Perilaku yang diamati | Bukti (diizinkan) | Heuristik yang dilanggar | Severity 1-4 | Usulan perbaikan | Owner | Status

Skala internal: 1 = kecil, 2 = sedang, 3 = mengganggu tugas, 4 = menghalangi tugas.

07 Pedoman UI/UX ramah pengguna

Prinsip inklusif: kebutuhan Gen X diperhatikan, tanpa menyamaratakan kemampuan pengguna berdasarkan usia.

JELAS
Bahasa kerja konkret; label tombol jelas; tidak hanya mengandalkan ikon.

TERBACA
Teks dasar nyaman dibaca, kontras memadai, ruang putih cukup.

TERARAH
Satu tugas utama per area; visual hierarchy; langkah tidak berlebihan.

TERPREDIKSI
Komponen dan posisi tindakan konsisten di seluruh halaman.

TERKENDALI
Konfirmasi tindakan, status yang jelas, cegah kesalahan input.

TERUJI
Coba pada tugas nyata/simulasi; revisi berdasarkan temuan, bukan selera.

STANDAR IMPLEMENTASI PROTOTIPE

Teknologi	HTML + CSS + JS; berjalan lokal; tidak perlu server/database.	**Konten**	Data dummy dengan label "simulasi"; hindari kredensial atau API internal.
Aksesibilitas	Periksa navigasi keyboard, focus state, label, kontras, resize 200%.	**Reproducibility**	README: cara membuka, skenario demo, halaman yang berubah.

08 Uji kegunaan & quality assurance

Bandingkan tugas yang sama pada versi awal dan prototipe jika kedua versi dapat diuji secara sah.

3 SKENARIO UJI (CONTOH)

TASK 1
Temukan jumlah produksi untuk tanggal yang ditentukan pada data simulasi.

TASK 2
Cari status pengiriman/pekerjaan dan jelaskan artinya.

TASK 3
Jika ada form dalam scope, selesaikan satu input contoh lalu koreksi kesalahan.

Selalu gunakan tugas sesuai fitur yang memang tersedia.

METRIK YANG DICATAT

01 **Keberhasilan**
Berhasil / gagal tanpa bantuan signifikan.

02 **Waktu**
Durasi menyelesaikan tugas (detik).

03 **Kesalahan**
Jumlah salah klik / salah isi / tersesat.

04 **Hambatan**
Ucapan, kebingungan, dan bagian yang perlu dijelaskan.


05 **Persepsi**
Skala kemudahan 1-5; SUS opsional bila prosedur sesuai.

SAMPEL & ETIKA

Target awal 3-5 pengguna relevan untuk menemukan isu kualitatif (bukan sampel statistik). Jika belum ada izin uji pekerja PHM, gunakan peserta simulasi dan tuliskan keterbatasannya. Minta persetujuan peserta; jangan merekam data rahasia.

09 Timeline realistis & dua workstream

6-18 November merupakan target internal yang dapat digeser; hanya draft artikel 9 November yang merupakan deadline kuliah.

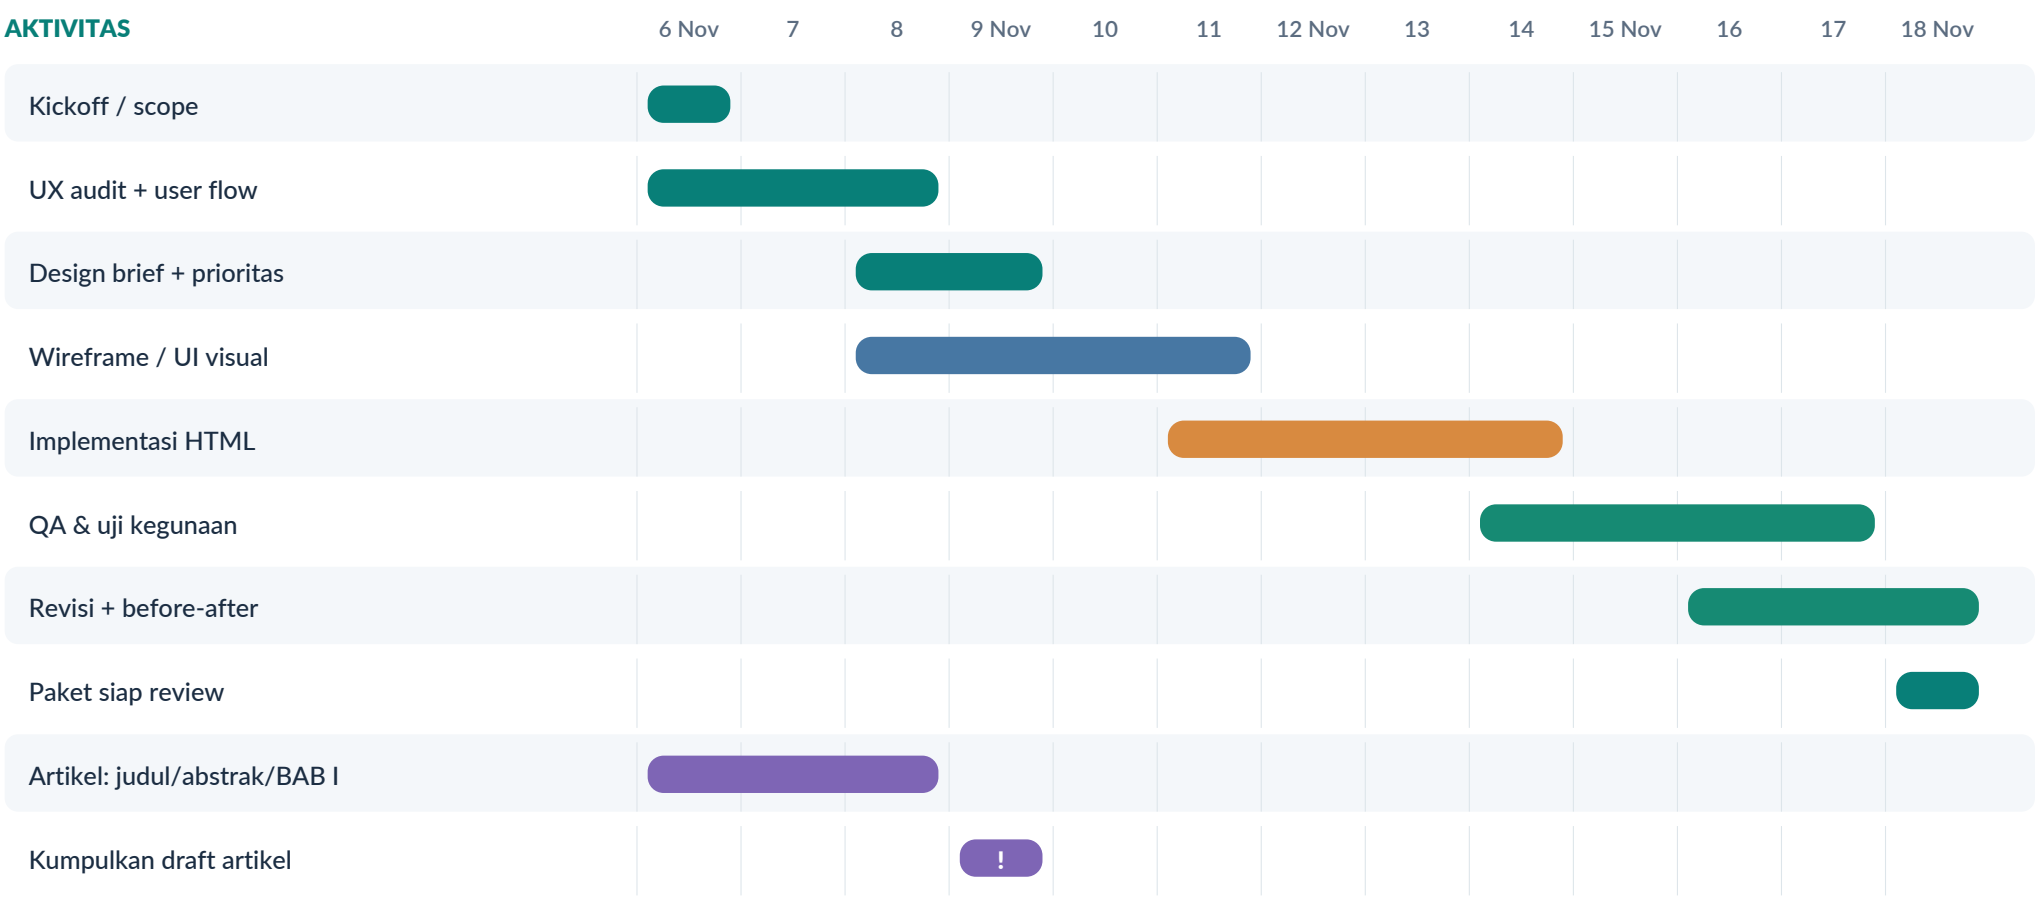

MEETING KUNCI 6 Nov: scope | 8 Nov: review audit/wireframe | 12 Nov: design-to-dev | 16 Nov: hasil uji | 18 Nov: final review internal

10 Checklist kontrol kualitas

Centang hanya jika terdapat bukti. Status pekerjaan disarankan: To do / In progress / Review / Done.

GATE 0 | KEAMANAN & SCOPE

- [ ] Semua anggota paham website mana yang boleh dianalisis.
- [ ] Akun, tautan dan data internal tidak dibagikan ke pihak lain.
- [ ] Halaman prioritas dan output prototipe disepakati.

GATE 1 | DISCOVER + DEFINE

- [ ] Ada log masalah UI/UX berbasis tugas dan bukti.
- [ ] Ada user flow saat ini dan pain point prioritas.
- [ ] Design brief memuat target, scope, dan asumsi yang perlu diuji.

GATE 2 | DEVELOP + TEST

- [ ] Wireframe / mockup mencakup halaman yang dipilih.
- [ ] HTML berjalan tanpa database atau data sensitif.
- [ ] Interaksi dasar, responsive, keyboard, label, kontras diperiksa.
- [ ] Skenario uji, hasil observasi, dan revisi dicatat.

GATE 3 | DELIVER

- [ ] Bukti before-after dan alasan setiap perubahan tersedia.
- [ ] HTML, aset, dan README dibundel rapi.
- [ ] Deck 7-10 menit + daftar keputusan yang diminta siap.

Jika ada gate yang belum lulus, revisi tahap terkait terlebih dahulu sebelum menyatakan "selesai".

11 Paket hasil yang dikirim ke Pak Yusuf

Bentuk pengiriman disesuaikan izin dan preferensi Pak Yusuf; buat mudah ditinjau tanpa lingkungan teknis.

01

HTML PROTOTYPE

index.html + assets + CSS/JS. Berjalan lokal; data dummy jelas bertanda simulasi.

02

BEFORE-AFTER

Perbandingan 1 layar per halaman: masalah awal, perubahan, dan alasan UX.

03

UX AUDIT & DESIGN BRIEF

Daftar temuan prioritas, scope, asumsi, user flow, dan keputusan desain.

04

HASIL UJI

Skenario, peserta yang diizinkan, observasi, metrik deskriptif, perbaikan.

05

README & CHANGELOG

Panduan membuka HTML, apa yang dapat dicoba, perubahan dan keterbatasan.

06

DEMO PRESENTASI

7-10 menit: masalah -> pendekatan -> demo -> bukti -> keputusan.

BATAS KLAIM SAAT PRESENTASI

Katakan "prototipe telah diuji pada skenario simulasi" bila demikian; jangan mengklaim dampak ke produktivitas, kenaikan adopsi pekerja, atau akurasi data aktual sebelum ada pengukuran dan persetujuan terkait.

12 Susunan presentasi 7-10 menit

Tujuan pertemuan: memperoleh evaluasi desain, kesepakatan perbaikan, dan izin tahap berikutnya.

1	**KONTEKS & TUJUAN** Arahan Pak Yusuf, batasan, halaman yang dipilih.	45 detik
2	**BUKTI MASALAH** Temuan audit terprioritas berdasarkan alur tugas.	1 menit
3	**FRAMEWORK & PROSES** Double Diamond + HCD, cara tim mengambil keputusan.	1 menit
4	**BEFORE-AFTER** Sorot maksimal 3 perbaikan paling berdampak.	2 menit
5	**DEMO HTML** Jalankan 1-2 skenario menggunakan data simulasi.	2 menit
6	**HASIL UJI** Tunjukkan observasi, metrik deskriptif dan revisi.	1 menit
7	**KEPUTUSAN BERIKUTNYA** Minta review desain dan arah iterasi. Akurasi data belakangan.	1 menit

PERTANYAAN PENUTUP: "Apakah arah desain ini sudah sesuai? Bagian mana yang perlu kami prioritaskan pada iterasi berikutnya, Pak?"

13

Agenda meeting internal pertama

Durasi 60 menit. Rapat harus berakhir dengan penanggung jawab, due date, dan bukti tugas yang disepakati.

00-10	**Align arahan & batasan**	Baca ulang izin website, output HTML, before-after; sepakati larangan akses.
10-25	**Pilih alur prioritas**	Buka website dan shortlist 1-2 halaman atau task flow.
25-40	**Tetapkan peran & tools**	Pilih lead/UX/design/dev; Drive, Figma, repository lokal/terbatas.
40-50	**Susun mini-backlog**	Top 5 audit issue; tugas 48 jam; blocker akses/izin.
50-60	**Selaraskan artikel & review**	Pastikan draft artikel 9 Nov dan jadwal review internal.

NOTULEN MINIMUM (SALIN)

Tanggal | Hadir | Scope | Halaman prioritas | Keputusan | Aksi (owner + due date) | Hambatan | Jadwal review berikutnya

14 Risiko, asumsi & sumber framework

Tiga kontrol penting: izin yang jelas, bukti yang dapat dilacak, dan klaim evaluasi yang proporsional.

Batas akses berubah	Tahan kegiatan; konfirmasi ruang akses, gunakan dummy data.
Tidak bisa wawancara pengguna	Lakukan heuristic audit + uji simulasi; tuliskan keterbatasan.
Scope terlalu besar	Kunci maksimal 1-2 halaman prioritas dan backlog lanjutan.
Desain bagus tetapi sulit digunakan	Uji tugas, perbaiki isu severity tertinggi; jangan hanya minta opini.
Jadwal artikel berbenturan	Pisahkan workstream akademik dan prototipe sampai 9 Nov.

SUMBER METODOLOGI

Design Council - Framework for Innovation / Double Diamond

ISO 9241-210:2019 - Human-centred design for interactive systems

NIST - Human Centered Design

Nielsen Norman Group - Heuristic Evaluations

W3C - Web Content Accessibility Guidelines 2.2

NNGroup - How Many Test Users in a Usability Study?

Catatan basis proyek: arahan Pak Yusuf melalui percakapan tim dan catatan awal PHM; rincian teknis merupakan usulan tim.
